CRONOGRAMA.

ID	Task Mode	ITEM	DESCRIPCION	Duration	Predecessors	Start	Finish
1			"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) DEL CORREGIMIENTO LA DOLORES PALMIRA	180 days		Wed 7/07/21	Tue 4/01/22
2			FASE 1	25 days		Wed 7/07/21	Sun 1/08/21
3			CONTEXTUALIZACION	1 day		Wed 7/07/21	Wed 7/07/21
4			RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE	5 days	3	Wed 7/07/21	Tue 13/07/21
5			ESTUDIOS DE LA FUENTE RECEPTORA	15 days	4	Tue 13/07/21	Wed 28/07/21
6			DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	11 days	4	Tue 13/07/21	Fri 23/07/21
7			TOPOGRAFÍA (PLANTA – PERFIL DEL SISTEMA	13 days	4	Tue 13/07/21	Mon 26/07/21
8			TOPOGRAFÍA (ESTRUCTURAS EXISTENTES Y NUEVO LUGAR DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7 days	7SS+7 days	Tue 20/07/21	Tue 27/07/21
9			DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE (DIAGNÓSTICO	5 days	8	Tue 27/07/21	Sun 1/08/21
10			FASE 2	50 days		Sun 1/08/21	Mon 20/09/21
11			ESTUDIO DE ALTERNATIVAS	15 days	9	Sun 1/08/21	Mon 16/08/21
12			EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES	20 days	11	Mon 16/08/21	Sun 5/09/21
13			GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE I)	15 days	12	Sun 5/09/21	Mon 20/09/21
14			FASE 3	75 days		Sun 5/09/21	Fri 19/11/21
15			DISEÑOS DEFINITIVOS GESTIÓN SOCIAL	7 days	13	Mon 20/09/21	Mon 27/09/21
16			TOPOGRAFÍA (PLANTA – PERFIL DEL SISTEMA)	10 days	12	Sun 5/09/21	Wed 15/09/21
17			ESTUDIO DE SUELOS	10 days	12	Sun 5/09/21	Wed 15/09/21
18			DISEÑO HIDRÁULICO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y RESIDUAL	20 days	16	Wed 15/09/21	Tue 5/10/21
19			DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS REDES DEL SISTEMA	30 days	18	Tue 5/10/21	Thu 4/11/21
20			DISEÑO ESTRUCTURAL DE COMPONENTES DEL SISTEMA	30 days	18	Tue 5/10/21	Thu 4/11/21
21			PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	30 days	15	Mon 27/09/21	Wed 27/10/21
22			PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	30 days	21SS	Mon 27/09/21	Wed 27/10/21
23			GESTIÓN DEL RIESGO	40 days	21SS+5 days	Sat 2/10/21	Thu 11/11/21
24			PRESUPUESTO DE OBRA	15 days	20	Thu 4/11/21	Fri 19/11/21
25			DISEÑO DEFINITIVO	15 days	24FF	Thu 4/11/21	Fri 19/11/21
26			FASE 4	18 days		Fri 19/11/21	Wed 8/12/21
27			GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS (PARTE II	18 days	25	Fri 19/11/21	Wed 8/12/21
28			FASE 5	27 days		Wed 8/12/21	Tue 4/01/22
29			GESTIÓN PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO	15 days	27	Wed 8/12/21	Thu 23/12/21
30			APROBACIÓN POR PARTE DE LA CVC	15 days	27	Wed 8/12/21	Thu 23/12/21
31			PERMISO DE INTERVENCIONES EN VIAS	25 days	27	Wed 8/12/21	Sun 2/01/22
32			PRESENTACIÓN Y GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	2 days	31	Sun 2/01/22	Tue 4/01/22
33			INFORME DEFINITIVO	5 days	32FF	Thu 30/12/21	Tue 4/01/22

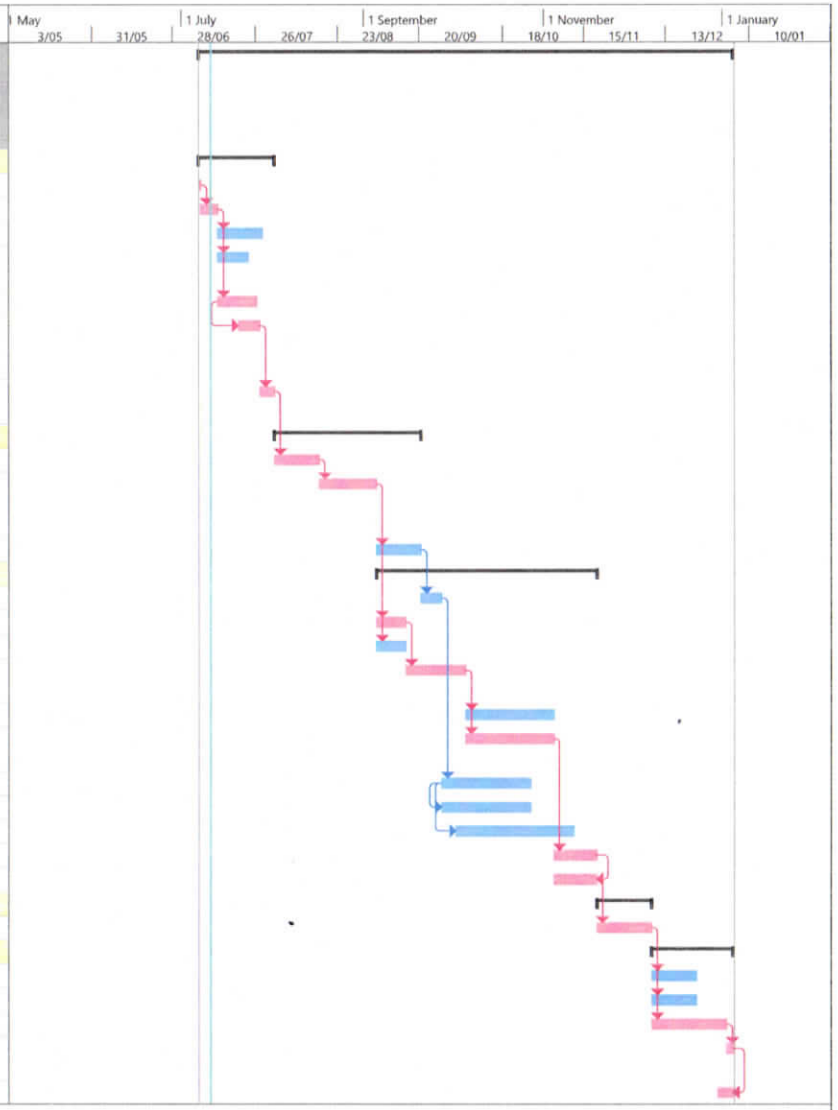

Proyecto: CRONOGRAMA LA D
Fecha: Sun 11/07/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			
